


Communauté d'Agglomération des Deux baies en Montreuillois

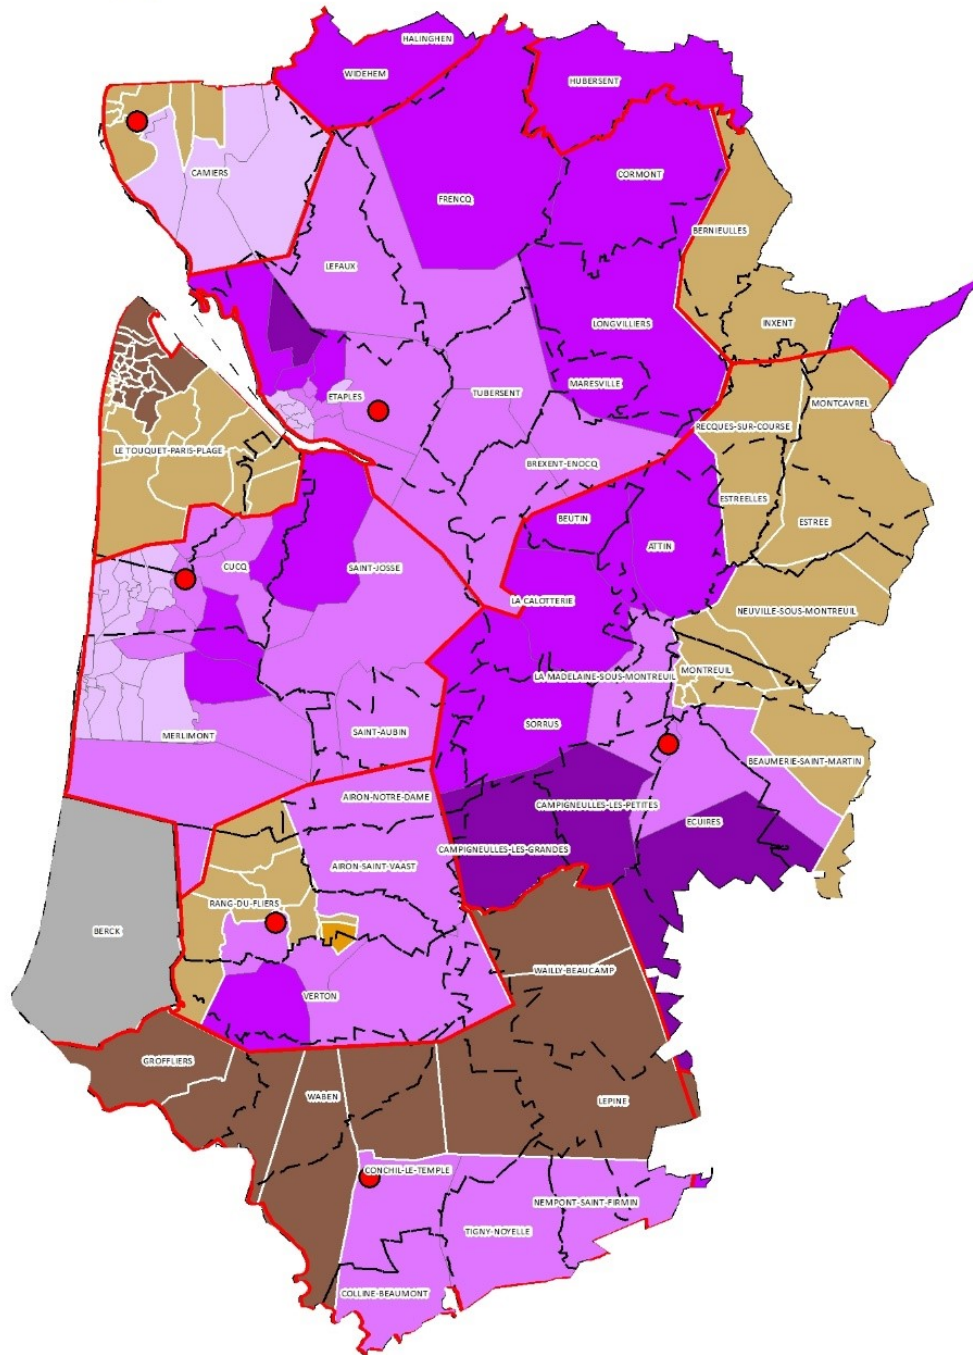

25 mai 2021

0 1 650 3 300 M

CHIFFRES CLES

Nombre de NRO posés :	6	SUR	6
Nombre de SRO posés :	74	SUR	149
Nombre de prises déployées :			25 205
Nombre de prises raccordées :			7 989

CHIFFRES FINANCIERS

Montant construction total :	1009200 €
Montant déjà versé :	528980 €
Montant à verser en 2020 :	319660 €
Participation aux raccordements :	504600 €
Montant total prévisionnel de participation :	1513800 €

Légende

NRO	Taux de raccordées / déployées inférieur à 30 %	Zone d'initiative privée
Contours NRO	entre 30 et 50 %	2ème trimestre 2021 (T0 + 18)
COMMUNES	entre 50 et 60 %	3ème trimestre 2021 (T0 + 19)
	supérieur à 60 %	4ème trimestre 2021 (T0 + 20)



Nous contacter

Contact@lafibrenumerique5962.fr

03.74.04.59.62

La Citadelle - Quartier des trois parallèles 335, allée du Général Girard, 62000 ARRAS

CAP FIBRE

www.capfibre.fr

0.800.159.162
